




Monitoramento do Portfólio de Serviços, Programas e Projetos de TIC

OUTUBRO – 2023





Resumo dos Programas e Projetos de TIC




Mapa Estratégico de TIC do Poder Judiciário: Agrupadores




Resolução CNJ nº 370 de 28/01/2021
 Estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).
atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706

Números dos Projetos do DTI/CNJ

Distribuição dos Projetos por Unidade

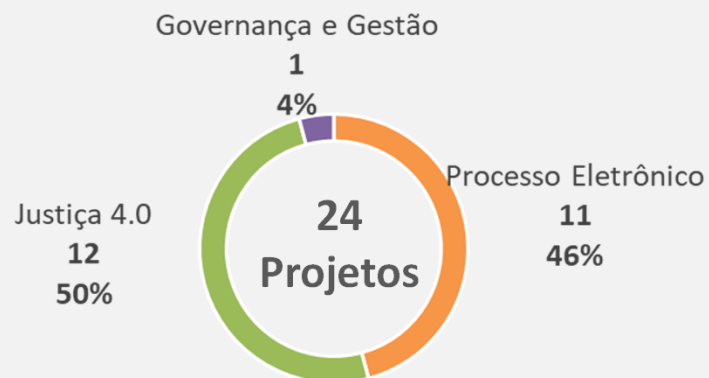


Distribuição dos Projetos pelos Temas ENTIC-JUD 2021-2026

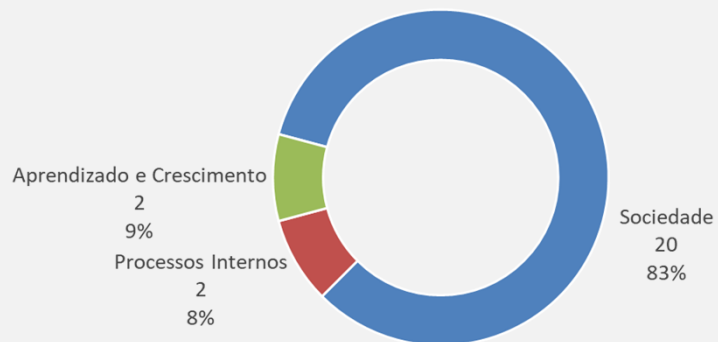

*Projetos de impacto nacional.

Distribuição dos Projetos Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD 2021-2026

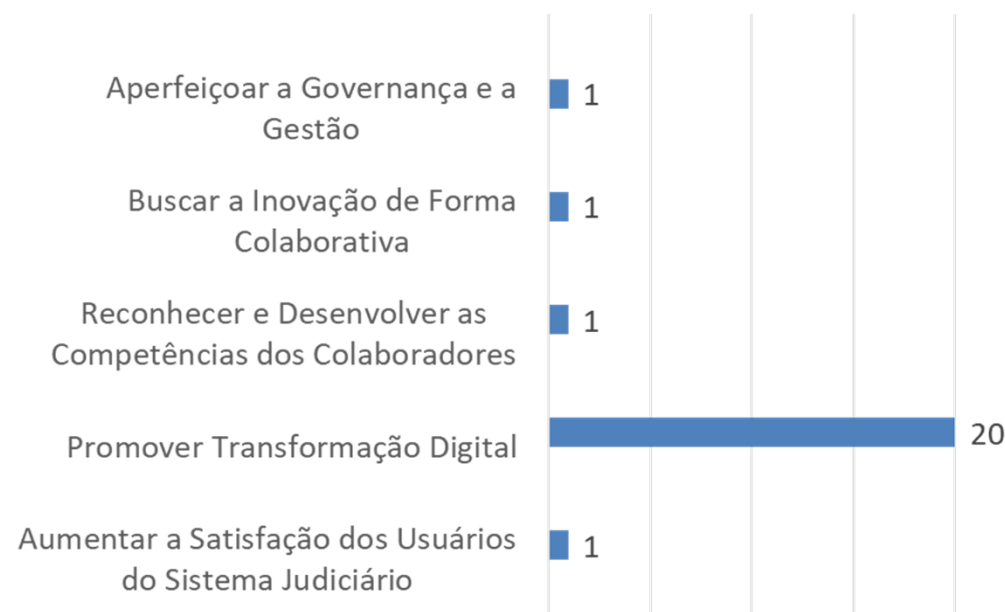

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	PREVJUD	
Progresso	97%	Data de Término 31/12/2023
Resultado Esperado	Construção do módulo Previdenciário J4.0 da PDPJ-Br , onde desenvolve-se uma solução para automatizar tanto o acesso às informações das bases de dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como o envio de ordens judiciais a esse instituto.	
Entregas Realizadas	- Implementação de 2 novas funcionalidades de segurança.	
Próximas Entregas	- Processo Administrativo Previdenciário; Publicação junto com as demais melhorias e correções do Módulo Previdenciário (Dossiês e Intimação) - data a definir; Mod. Previdenciário: Inclusão de novos dados de dependentes: Realização de novos mapeamentos na aplicação para que os dados sejam retornados nos Dossiês; Intimação Judicial: Acompanhamento dos pilotos do TRF-3 e TRF-4; e Preparação da Documentação referente a versão 02 (versão com diversas melhorias e correções) dos <i>endpoints</i> para apresentação aos TRFs; Algoritmos de tratamento e erros dos serviços na Dataprev; Realização de webinários específicos para ramos da Justiça; e Aprimoramento dos tutoriais já lançados.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	BNMP 3.0	
Progresso	98%	Data de Término 06/01/2024
Resultado Esperado	Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0) sistema responsável por registrar, consolidar e integrar as informações sobre as pessoas presas no território nacional, a partir de cadastro individualizado e alimentado em tempo real, incluindo as pessoas privadas de liberdade.	
Entregas Realizadas	- Início dos testes pelos tribunais.	
Próximas Entregas	- Realização de testes e correção dos bugs identificados; e Planejamento da fase 2.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	Codex - Melhorias Evolutivas
Progresso	75% Data de Término 31/12/2024
Resultado Esperado	Aprimoramentos no Codex , plataforma responsável por realizar a consolidação das Bases de Dados Processuais, provendo o conteúdo textual de documentos e dados estruturados.
Entregas Realizadas	- Monitoramento das atividades , issues, falhas, e melhorias (atividade contínua) com resolução de 40 issues , entre elas: CN-1427 : Implementação do histórico de distribuição, na parte do extrator, garante que as informações dos tribunais sejam extraídas e sincronizadas, entrando em conformidade com a base do Codex . A melhoria deste incremento garante que um processo que foi distribuído a um determinado órgão julgador, e este órgão não sendo competente para julgá-lo, ocorra a redistribuição a outro órgão; CN-1435 : Adicionamento de tela para apresentar informações dos particionamentos para que o usuário do Codex com acesso à fonte de Dados possa pesquisar uma fonte de dados para adicionar o proxy um novo tipo de Rota "Processo Partes Metadados por Id's" para o serviço de recuperar pessoas metadados por ids; CN-1762 : Criação de tela de visualização: Órgão Julgador; Órgão julgador local; Colegiado ; Tipo parte; Tipo de documento; Jurisdição; Órgão Justiça; Tipo de complemento (Falta <i>backend</i>); Tipo de complemento tabelado (Falta <i>backend</i>); Competência.
Próximas Entregas	- Atividade contínua : resolução de issues, correção de falhas e implementação de melhorias na ferramenta de acordo com as prioridades identificadas no backlog.
Impedimentos	- Sem impedimentos.
Projeto	Sniper
Progresso	98% Data de Término 31/12/2023
Resultado Esperado	Software para cruzamento de informações de bases de dados diferentes , destacando os vínculos societários, patrimoniais e financeiros existentes entre pessoas físicas e jurídicas.
Entregas Realizadas	- Resolução de issue relacionada a análise de erro na pesquisa de alguns CNPJs.
Próximas Entregas	- Módulo de Dados Sigilosos – dados fiscais; Aguardando lançamento do Infojud em produção, para sua integração com o Sniper; Aditivo de prazo e escopo do contrato com a empresa contratada para o desenvolvimento em avaliação; Revisão da base de dados do Radar.
Impedimentos	- Sem impedimentos.

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	Domicílio Eletrônico	
Progresso	83%	Data de Término 31/12/2023
Resultado Esperado	Módulo que possibilitará o recebimento de citação e intimação dos processos eletrônicos pelas instituições públicas e privadas, através do desenvolvimento de API e outros mecanismos de integração assíncrona.	
Entregas Realizadas	- Empresas cadastradas: 6.635; Usuários cadastrados: 1.469; Tribunais em produção: 23 (TJMT, TJRS, TJPA, TJRJ, TJGO e TJDFT, TJPB, TJPR e TJAP); Estaduais: TJAP, TJDFT, TJGO, TJMT, TJPA, TJPB, TJPR, TJRJ, TJRR, TJRS e TJSE; Justiça do Trabalho: TRT-5, TRT-6, TRT-7, TRT8, TRT-9, TRT-13, TRT-16, TRT-17, TRT-18, TRT-20, TRT-21 e TRT-23; Comunicações Processuais: 379.548.	
Próximas Entregas	- Tribunais com integração em andamento: Total: 61 tribunais; Tribunais pendentes de integração: Total: 16 tribunais; Painel de Monitoramento: https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=205de01d-6bb2-45c3-8be3-a61ea20b9957&sheet=fe35a4b1-ea16-453c-8d29-7bde4e013ec7&theme=horizon&lang=pt-BR&opt=ctxmenu,currsel ; Integração do Pje pelo DTI; Acompanhamento da Implantação e <i>phase out</i> .	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Novo Sistema Nacional de Gestão de Bens	
Progresso	88%	Data de Término 15/08/2024
Resultado Esperado	Sistema que visa o cadastro e registro de bens apreendidos nos procedimentos tramitados na justiça brasileira, permitindo um melhor controle dos processos e bens pelos órgãos judiciais.	
Entregas Realizadas	-	
Próximas Entregas	- Implementação do Plugin SNGB via CODEX; Identificação e categorização dos problemas apontados pelos usuários no uso do sistema (bugs, usabilidade e performance); e Diagnóstico sobre a proposta visual e usabilidade do sistema.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	Serviços Estruturantes
Progresso	98% Data de Término 31/12/2024
Resultado Esperado	Criação e sustentação dos chamados Serviços Estruturantes, os módulos essenciais para o funcionamento da PDPJ-br.
Entregas Realizadas	- Serviço de Autenticação (Single Sign-On/SSO) : [Melhoria] Rever flow de autenticação com OTP; Serviço de Notificações : [Melhoria] Envio de Notificações por Telegram; [Melhoria] Ajustar informações na grade "Minhas subscrições"; [Melhoria] Ajustar informações na grade "Notificação em formato Email"; [Melhoria] Enviar notificações no formato Documento via Telegram.
Próximas Entregas	- Serviço de Autenticação (Single Sign-On/SSO) : [Melhoria] Criar tema para o Módulo Auxiliares da Justiça; [Melhoria] CSJT solicitou que fosse criado um tema específico para eles no SSO; [Melhoria] Melhorar mensagem de e-mail de tentativa de login; [Melhoria] Problema ao consultar um CPF; Serviço de Notificações : [Melhoria] Automação Notificações Front-end; e [Melhoria] Remover <i>bot</i> Telegram do Notificações <i>Job</i> .
Impedimentos	- Sem impedimentos.

Projeto	Portal de Serviços
Progresso	57% Data de Término 31/12/2023
Resultado Esperado	Portal onde todos os atores processuais e partes, de todo o país , poderão consultar andamento de processos, enviar petições, ajuizar nova demanda, controlar prazos e agendas, receber intimação/citações, verificar publicações no Diário da Justiça, verificar pauta de audiências e sessões de julgamento em um só ambiente.
Principais Entregas	- Levantamento de necessidades de desenvolvimento de novos serviços para as TPUS (retorno por tipo de justiça e grau por exemplo).
Próximas Entregas	- Funcionalidade "Consulta Processual"; Funcionalidade "Peticionar"; Funcionalidade "Novo Processo"; Funcionalidade "Minhas Petições"; Funcionalidade "Dívida Ativa"; Funcionalidade "Push"; Funcionalidade "Autenticação"; Funcionalidade "Acervo"; Funcionalidade "Expediente"; Funcionalidade "Custas"; Acessibilidade.
Impedimentos	- Revisão de escopo prevendo a implementação do Portal utilizando a nova arquitetura da PDPJ-Br.

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	Sinapses - Melhorias e Padronização/Capacitações EaD IA		
Progresso	78%	Data de Término	31/01/2024
Resultado Esperado	Estratégia PDCA de melhoria contínua, de forma complementar o desenvolvimento do Modelos de Tipos de Petição, Contestação e Procuração.		
Entregas Realizadas	-		
Próximas Entregas	- Treinamento EaD autoinstrucional "Anotação de Dados" ; Treinamento EaD autoinstrucional sobre o modelo de "Agrupamento por Similaridade"; Treinamento EaD autoinstrucional sobre o modelo de "Classificação de Processos"; e Treinamento EaD autoinstrucional sobre o modelo de "Precedentes Qualificados".		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		

Tema: Sociedade - OE 3 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores

Justiça 4.0

Projeto	Capacitações para desenvolvedores nas tecnologias utilizadas pela PDPJ-Br	
Progresso	17%	Data de Término 31/10/2024
Resultado Esperado	Elaboração de cursos técnicos para capacitação de desenvolvedores dos Tribunais nas tecnologias utilizadas pela PDPJ-Br.	
Entregas Realizadas	- Capacitação em Java Básico; Pré-inscrições: 25/09 a 04/10; 1.151 pré-inscrições recebidas; Seleção dos cursistas: 05 a 06/10; Divulgação da lista de 250 cursistas selecionados: 09/10 (link: https://www.cnj.jus.br/justica-4-0-divulga-lista-de-pessoas-selecionadas-para-curso-de-java-basico/); Matrículas: 09 a 16/10.	
Próximas Entregas	- A serem oferecidos primeiro em formato síncrono com aulas ao vivo e depois em formato autoinstrucional via Ceajud: Capacitação em Java Básico; Início das aulas: 16/10; Capacitação em Java Avançado; Capacitação em Angular; e Capacitação em Testes Automatizados.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Tema: Aprendizado e Crescimento - OE 4 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa

Justiça 4.0

Projeto	Expansão Codex
Progresso	75% Data de Término 31/12/2023
Resultado Esperado	Expansão do Codex para 92 Tribunais .
Entregas Realizadas	- Painel de Monitoramento atualizado em 13/10/23: https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=c4f3cf02-76ea-4e4f-b0ad-35abd17769b8&sheet=3679ac88-fcc5-4fe5-b936-c8d9209cad17&theme=horizon&lang=pt-BR&opt=ctxmenu,currsel .
Próximas Entregas	- Avaliação da cobertura: % do acervo; Avaliação da qualidade: adequação dos dados ao consumo: Consultas; Painéis de Indicadores; Inteligência Artificial.
Impedimentos	- Sem impedimentos.

Tema: Processos Internos - OE 5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

Justiça 4.0

Projeto	Data Lake
Progresso	54% Data de Término 31/12/2024
Resultado Esperado	Estratégia de gerenciamento e governança de dados em alto padrão, consolidando em repositório centralizado os dados originados de sistemas do Poder Judiciário .
Entregas Realizadas	- Revisão de escopo e replanejamento de acordo com as novas prioridades da gestão do Programa.
Próximas Entregas	- Configuração do ambiente de testes (<i>sandbox</i>); Configuração do ambiente de homologação (CSJT); Provisionamento de ambiente de produção; Atualização dos códigos das APIs e rotinas de consumo de dados; e Realizar alinhamento sobre o aperfeiçoamento do compartilhamento de informações entre CODEX e Data Lake através da Messageira.
Impedimentos	Sem impedimentos.

Tema: Sociedade - OE 1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário

Processo Eletrônico

Projeto	Ferramenta de Acessibilidade no PJe Nacional
Progresso	54% Data de Término 06/11/2024
Resultado Esperado	Revisão da versão nacional para garantir uma maior acessibilidade dos servidores dos tribunais utilizando a extensão de navegador para a automatização.
Entregas Realizadas	- (20 mil usuários) Versão 1.8.56: Treinamento Presencial para o TJRO.
Próximas Entregas	- Implantação do TJMG; Alinhamento com a Nova Gestão do CNJ.
Impedimentos	- Sem impedimentos.

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Processo Eletrônico

Projeto	RECEITAJUD (Automação do InfoJud)		
Progresso	83%	Data de Término	30/11/2023
Resultado Esperado	Redução de tempo de obtenção das informações na Receita Federal e tramitação dos processos.		
Entregas Realizadas	- Atualização da documentação ECF (Escrituração Contábil, Fiscal); Revisão e atualização de código backend com ajustes propostos pelo CNJ; Atualização do certificado do CNJ no ambiente da RFB.		
Próximas Entregas	- Configurações e testes dos <i>endpoints</i> para o novo ambiente de produção na RFB; Liberação do ambiente de produção pela RFB.		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		

Projeto	DATAJUD Integrado ao CODEX		
Progresso	55%	Data de Término	30/09/2024
Resultado Esperado	Simplificar o envio de dados pelos tribunais para alimentar o DATAJUD e garantir que os dados sejam mais fidedignos e informem inconsistências aos responsáveis pela informação nos tribunais.		
Entregas Realizadas	- DATAJUD - Protocolo 01 (Higienização das Informações).		
Próximas Entregas	- Painel de Indicadores - Codex Justiça em Números e Painel de Indicadores - Codex Saneamento.		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Processo Eletrônico

Projeto	E-Natjus	
Progresso	50%	Data de Término 30/05/2024
Resultado Esperado	Reduzir a possibilidade de decisões judiciais conflitantes permitindo concentrar em um único banco de dados as notas técnicas e pareceres técnicos , bem como facilitar a obtenção de dados estatísticos pelos usuários que atuam e acionam o sistema.	
Entregas Realizadas	- Hospital Albert Einstein: KeyCoack para o ambiente de Produção - TJBA - Solução (Natjus) aprovada pelo CNJ.	
Próximas Entregas	- Albert Einstein: Finalizar testes com Usuários diferentes (Login de Produção - PDPJ) - TJBA: Natjus Implementação do KeyCloack - Fluxo de Transação de Nota Técnica.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	
Projeto	Integração do e-Carta ao PJe	
Progresso	80%	Data de Término 29/12/2023
Resultado Esperado	Integrar o envio de correspondências do PJe com o serviço e-Carta dos Correios , automatizando o envio de correspondências e a juntada automática dos retornos nos autos, proporcionando uma maior visibilidade aos processos.	
Entregas Realizadas	- Implementações de novas visualizações do Painel do e-Carta Nacional (TJMT e CNJ).	
Próximas Entregas	- Disponibilização do ambiente e interface para o Painel do eCarta no CNJ.	
Impedimentos	- Ponto de atenção: aguardando novo cronograma do CNJ para a implementação do Painel Nacional do eCarta.	

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Processo Eletrônico

Projeto	Módulo de Sessão de Julgamento	
Progresso	84%	Data de Término 30/11/2023
Resultado Esperado	Desenvolvimento de melhorias na solução responsável pelo acompanhamento e gestão das sessões de julgamento virtuais nos tribunais.	
Entregas Realizadas	- Finalização da codificação e testes de funcionalidades; Ajustes e adequações com as extensões do TRF5.	
Próximas Entregas	- Homologação no ambiente do CNJ e Piloto junto ao TRF5.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Mandamus	
Progresso	71%	Data de Término 29/12/2023
Resultado Esperado	Criação de solução baseada em Inteligência Artificial visando a melhoria da tramitação de processos por meio da automatização dos processos de geração e cumprimento de mandados judiciais.	
Entregas Realizadas	- Atualização da documentação da Aplicação e de Integração com o Mandamus; Versão para IOS.	
Próximas Entregas	- Piloto com novos Tribunais parceiros (TJPA, TJBA, TJAP, TJAM e TRF1). Nova versão da aplicação. Liberação do Fluxotools.	
Impedimentos	- Sem impedimento.	

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Processo Eletrônico

Projeto	Melhoria do Processo de Execução Fiscal	
Progresso	70%	Data de Término 20/05/2024
Resultado Esperado	Soluções que permitam a tramitação célere e com máximo de automação para enfrentar o problema da execução fiscal .	
Entregas Realizadas	- Piloto no TJCE e TJRJ - TJRN Piloto (e-Carta na Unidade Núcleo de Execução fiscal 4.0) .	
Próximas Entregas	- Alinhamento com a Nova Gestão do CNJ para o Programa de Automação da Execução e Tribunal TJPE - Plano de entrada do Piloto (Comarca) .	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	
Projeto	Mineração de Processos - JuMP	
Progresso	98%	Data de Término 30/11/2023
Resultado Esperado	Fase 3: Desenvolvimento de novas funcionalidades para descoberta e apresentação de fluxo processual com pesos dos movimentos judiciais; desenvolvimento de algoritmos de descoberta de ponto de início e fim de processos e fluxos de movimentos priorizados; desenvolvimento da funcionalidade para análise do impacto das transações críticas.	
Entregas Realizadas	- Apresentação do webinar JuMP/CNJ 3.0; Início de Treinamentos (TRT3): Total: 22 participantes.	
Próximas Entregas	- Treinamentos (TJPR, TRT14, TRE-BA, TJDFT, TJMA, TJAP, TSE).	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	



Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Processo Eletrônico

Projeto	SENAD (Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas)		
Progresso	75%	Data de Término	10/03/2024
Resultado Esperado	Criar um serviço de integração na PDPJ, permitindo aos tribunais receber as ordens de autorização de venda de bens , seja ela cautelar antecipada ou definitiva por sentença de perdimento.		
Entregas Realizadas	- MJSP Aplicação Pronta para receber Requisições no Webhook Produtivo - SNGB - Realizou a apresentação do Sistema / Integração, para SINESP.		
Próximas Entregas	- SNGB – Fechando parceria com Tribunais para os Testes (TJGO) - Vídeos de Orientações da Integração. MJSP - Integrar com o SNGB.		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		

Projeto	SIDEJUD (Sistema Nacional de Depósitos Judiciais)		
Progresso	70%	Data de Término	30/06/2024
Resultado Esperado	Permitir que os tribunais realizem a gestão de seus depósitos judiciais e de pagamentos de precatórios , mantendo o controle das movimentações financeiras.		
Entregas Realizadas	- Ajustes nos ambientes de homologação e desenvolvimento do SIDEJUD no CNJ; Serviço de <i>load balance</i> para transação bancária.		
Próximas Entregas	- Módulo de Transação Bancária (Previsão 12/2023). Novos ajustes e configurações nos ambientes do SIDEJUD no CNJ.		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		


Tema: Processos Internos - OE 5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

Governança e Gestão

Projeto	Monitoramento de Conformidade de normativos de TIC pelos Órgãos do Judiciário		
Progresso	80%	Data de Término	15/01/2024
Resultado Esperado	Implementar e operacionalizar o Serviço Nacional de Monitoramento de Conformidade de TIC (SNMC-TIC) para os normativos de TIC instituídos pelo CNJ. Integração do SNMC-TIC com o PJe para auxiliar o monitoramento dos pedidos de Acompanhamento de Cumprimento de Decisão (Cumprdec).		
Entregas Realizadas	- Cronograma replanejado; <i>Backend</i> refatorado para a versão 1.5.		
Próximas Entregas	- Publicação do MVP 1.5 (estimado para 18/11/23); MVP 2.0 integração com o Pje (estimado para 18/12/23).		
Impedimentos	- Problemas com a utilização do UIKIT.		



Informações Finais



Calendário de Reuniões para 2023

O grupo se reunirá periodicamente para reportar sobre o monitoramento do Portfólio dos Programas e Projetos de TIC, alinhado a proposta de operacionalizar a Rede de Escritórios de Projetos Nacional.

Proposta de agenda:

1º Semestre

- 23 de janeiro – 11ª Reunião
- 27 de fevereiro – 12ª reunião
- 20 de março – 13ª reunião
- 17 de abril – 14ª reunião
- 22 de maio – 15ª Reunião
- 19 de junho – 16ª Reunião

2º Semestre

- 24 de julho – 17ª Reunião
- 21 de agosto – 18ª Reunião
- 25 de setembro – 19ª Reunião
- **23 de outubro – 20ª Reunião**
- 20 de Novembro – 21ª Reunião
- 18 de Dezembro – 22ª Reunião



Contatos

- **Escritório de Projetos de TIC**
- **SEGPP/COAG/DTI/CNJ**
- **(61) 2326-5332**
- segpp@cnj.jus.br
